


Cronograma de Obras Base Ajustado SC-05-40 (Ex Fundo Puchuncaví)

Cronograma Vigente					Cronograma Ajustado	
Etapa	Obra	Total	Año Inicio	Año Término	Año Inicio	Año Término
	Designación					
Producción	Interconexión Esval					
TOTAL ETAPA PRODUCCION						
Distribución	Proyectos de Ingeniería Agua Potable	502	2025	2025	2026	2026
	Interconexión ESVAL S.A - TK ASN S.A. HDPE DN=250 mm y L=6,0 m	21	2026	2026	2027	2027
	Construcción Estanque V=400 m3	10.290	2026	2026	2027	2027
	Ampliación Estanque V=400 m3	5.389	2032	2032	2033	2033
	Construcción PEAP Puchuncaví Q=30 L/s y hm=45 m	722	2026	2026	2027	2027
	Ampliación PEAP Puchuncaví en Q=30 L/s	722	2030	2030	2031	2031
	Ampliación PEAP Puchuncaví en Q=30 L/s	722	2036	2036	2037	2037
	Construcción Impulsión PEAP Puchuncaví HDPE PN10 DN=315 mm y L=12 m	42	2026	2026	2027	2027
	Generador Respaldo	620	2026	2026	2027	2027
TOTAL ETAPA DISTRIBUCION		19.030				
Recolección	Proyectos de Ingeniería Aguas Servidas	728	2025	2025	2026	2026
	Construcción PEAS 01 Q=6,0 L/s y hm=30 m	1.356	2026	2026	2027	2027
	Ampliación PEAS 01 en Q=6,0 L/s	450	2032	2032	2033	2033
	Construcción PEAS 02 Q=6,0 L/s y hm=30 m	1.356	2026	2026	2027	2027
	Ampliación PEAS 02 en Q=6,0 L/s	450	2030	2030	2031	2031
	Construcción Impulsión PEAS 01 HDPE PN-10 DN=160 mm y L=446 m	1.338	2026	2026	2027	2027
	Construcción Impulsión PEAS 02 HDPE PN-10 DN=160 mm y L=670 m	2.010	2026	2026	2027	2027
	Colector Gravitacional HDPE DN=200 mm y L=570 m (obra aportada por terceros)	-	2026	2026	2027	2027
	Generador Respaldo PEAS 1	620	2026	2026	2027	2027
	Generador Respaldo PEAS 2	620	2026	2026	2027	2027
TOTAL ETAPA RECOLECCION		8.928				
Disposición	Interconexión Esval					
TOTAL ETAPA DISPOSICION						
TOTAL GENERAL		27.958				

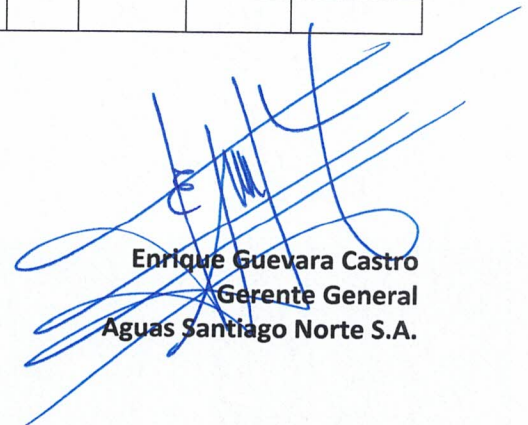

Enrique Guevara Castro
Gerente General
Aguas Santiago Norte S.A.
